

Regio Deal Foodvalley

Kwalitatieve voortgangsrapportage
eerste helft 2023



**Toekomstbestendige
landbouw**



**Voeding en
gezondheid**




**Kennis en
innovatie**

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Managementsamenvatting	4
Algemene voortgang	6
Thema's en projecten - overzicht	7
1 Transitie landbouw	8
Transitie landbouw	9
Voortgang en beheersmaatregelen	10
2 Voeding en gezondheid	12
Voeding en gezondheid	13
Voortgang en beheersmaatregelen	14
3 Kennis en innovatie	15
3A Fondsen en innovatie	16
Voortgang en beheersmaatregelen	16
3B World Food Experience	18
Voortgang en beheersmaatregelen	18
3C Food Academy Nijkerk	19
Voortgang en beheersmaatregelen	19
Financiën	21
Opbouw Meerjarenbegroting	21
Realisatie eerste helft 2023	22
Cumulatieve realisatie	23

Proces

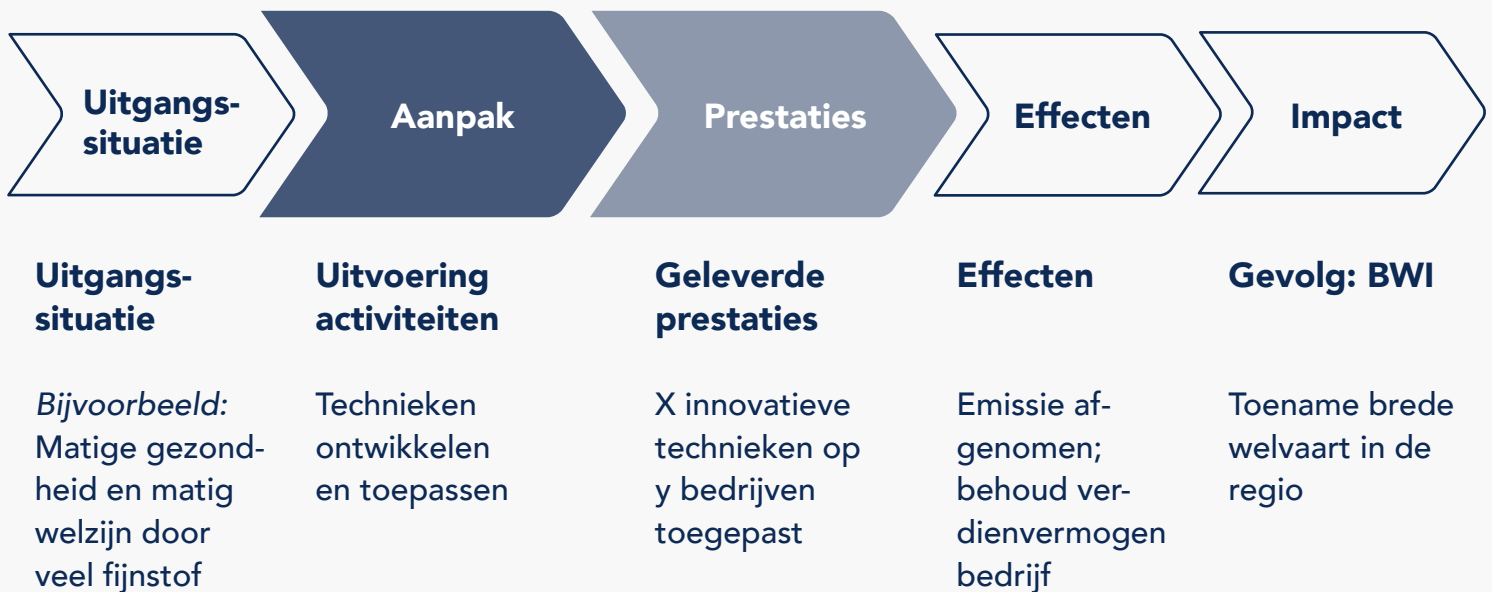

Legenda voortgang

 Loopt volgens planning

 Beperkt vertraagd

 Gestopt of sterk vertraagd

Managementsamenvatting

Kwalitatieve voortgangsrapportage Regio Deal Foodvalley eerste helft 2023

Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley richt zich op een regionale en integrale aanpak om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen en de daaraan gekoppelde economische kansen te benutten. We werken daarmee aan de brede welvaart voor inwoners en bedrijven. We realiseren deze impact via drie thema's:

1. Versnelde transitie van de **landbouw**
2. **Voeding en gezondheid**; van prille start tot oude dag
3. Versterking **kennis- en innovatiecluster**

Uitvoering eerste helft 2023

Deze rapportage geeft een kwalitatieve weergave van de voortgang in de eerste helft van 2023. In grote lijnen ziet de voortgang er goed uit. Wel heeft bij de start van de Regio Deal Covid-19 invloed gehad op de uitvoering, zeker waar fysieke bijeenkomsten aan de orde waren, zoals studies binnen de eetomgeving van mkb, horeca en wijken, en ook werving van studenten voor de Food Academy Nijkerk (FAN). Daar is zoveel mogelijk creatief mee omgegaan en achterstanden zijn grotendeels weer ingelopen.

Thema 1: Transitie landbouw

In dit eerste thema van de Regio Deal Foodvalley zetten we in op de versnelling van de ontwikkeling van de primaire sector naar een toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw. Binnen dit thema ontwikkelen we maatregelen voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, verder terugdringen van de uitstoot van emissies, werken we aan nieuwe verdienmodellen voor agrariërs én een sterkere verbinding tussen boeren en inwoners in het gebied. In grote lijnen lopen alle werkpakketten volgens planning en budget.

Het [omgevingsmeetnetwerk stikstof](#) is in maart 2023 gelanceerd. Met subsidie van provincie Gelderland is het meten van stikstof [uitgebreid met depositiemetingen](#). Verder worden op 19 agrarische bedrijven emissies in de stal gemeten. Met resultaten van deze metingen kunnen modellen voor de regio worden geoptimaliseerd en gebruikt worden voor monitoring en scenario-ontwikkelingen.

De ervaringen vanuit bodem en waterprojecten zijn september 2023 breed gedeeld met een [whitepaper](#) en [video](#). De samenwerking die tussen waterschap, agrariërs en onderzoeksinstituten is ontstaan is nuttig, leerzaam en inspirerend en veelbelovend voor (toekomstige) gebiedsgerichte aanpakken.

De bijdrage van gemeente Veenendaal is ingezet voor het ontwikkelen van een dashboard voor het bedrijvenmeetnetwerk om agrariërs inzicht te geven in hun stalemissies. OnePlanet levert hier een bijdrage aan.

De resultaten uit de projecten circulair veevoer zijn in analyse.

Ondanks de vogelgriep zijn er met aanpassingen in het onderzoek toch resultaten geboekt.

Over de kennis en resultaten van de Regio Deal wordt breed gecommuniceerd via de website [boeraanhetroer.nl](#), maandelijkse nieuwsbrieven, masterclasses en bodemcursussen, een webinar, demonstratiebijeenkomsten, artikelen in de regionale bladen en vakbladen, leertafelbijeenkomsten en handboeken voor agrariërs zoals [Kruiden zaaien doe je zo!](#)

Aandachtspunten

Om voldoende metingen over verschillende seizoenen te kunnen doen wordt voor een aantal projecten budgetneutrale verlenging gevraagd voor uitvoering van werkzaamheden.

Thema 2: Voeding en gezondheid

Binnen de Regio Deal Foodvalley werken we in zes werkpakketten (van prille start tot oude dag) aan gezonde en duurzame voeding. Met nationaal toepasbare concepten, richtlijnen en adviezen dragen we bij aan het Preventieakkoord; verbeterde voeding(skennis) en interdisciplinaire samenwerking in de zorg. Door ons te richten op verbeterde informatie en richtlijnen voor zowel patiënten als (zorg)professionals werken we aan voeding op maat voor kwetsbare groepen.

Alle zes werkpakketten zijn volop in uitvoering en bezig met analyses van resultaten. Resultaten worden breed gedeeld in events voor professionals. In alle werkpakketten is afstemming en samenwerking met regionale en landelijke partijen en organisaties. Ook wordt nagedacht over implementatie van resultaten met deze partijen. Een stakeholdergroep van een breed palet aan experts denkt hierover mee. In de eerste helft van 2023 zijn onder andere [wetenschappelijke publicaties](#) en [systeemkaarten](#) verschenen en deze zijn toegelicht op congressen en workshops. En er zijn gastcolleges en [onderwijsprojecten](#) verzorgd voor zorgprofessionals in opleiding, van verpleegkundige tot artsen. Er wordt actief gecommuniceerd naar diverse doelgroepen onder andere via [LinkedIn](#).

Aandachtspunt

Vanwege o.a. zwangerschappen lopen een aantal projecten uit waarvoor budgetneutrale verlenging aangevraagd zal worden.

Thema 3: Kennis en innovatie

Project 3A: Fondsen en innovatie

Ons doel is om de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in de sectoren landbouw en voeding en gezondheid te bevorderen om de marktintroductie van innovaties te versnellen.

Managementsamenvatting

Kwalitatieve voortgangsrapportage Regio Deal Foodvalley eerste helft 2023

Door toegang te bieden tot gedeelde onderzoeks- en proef-faciliteiten en door strategische investeringsmogelijkheden te faciliteren, streven we ernaar het proces te stroomlijnen en belemmeringen voor innovatie te verminderen. Met de inzet van fondsmiddelen voor gedeelde apparatuur en faciliteiten stimuleren we innovaties. De uitputting van de fondsen verloopt goed. Het digitale platform [Foodleap](#) is gelanceerd als match-making-platform tussen actoren en hun faciliteiten.

Voor het fonds gedeelde faciliteiten zijn de regels zodanig aangepast dat dit fonds toegankelijker is voor initiatieven. Bovendien is een deel van de fondsmiddelen ingezet voor [vouchers voor mkb](#) om gebruik te maken van gedeelde faciliteiten. Deze voucherregeling is van kracht sinds juni 2023 en wordt goed gevonden.

Project 3B: World Food Experience

Hoe motiveer je mensen om gezonder en duurzamer te eten? Een vraag die veel partijen binnen de Regio Deal Foodvalley bezighoudt. In de [World Food Experience](#) (WFE) worden beleving, verbeeldingskracht en entertainment hiervoor ingezet. De WFE wordt een thema-attractie over voedsel die bezoekers meeneemt op een persoonlijk voedselavontuur. Door te zien, voelen, proeven en ruiken, worden zij spelenderwijs bewust van alle aspecten rond ons eten en de keuzes die we daarin maken. De WFE kent, vanwege een aantal oorzaken, vertraging in de uitvoering. Namelijk door een beroep ingesteld bij de Raad van State begin 2022 door de Samenwerkende Milieuorganisaties Ede (SME) tegen het bestemmingsplan van de WFE, en noodzakelijke aanpassingen in de ontwerpen als gevolg van stijgende bouwkosten. Er is een [herontwerp](#) uitgewerkt dat voorligt bij gemeente Ede en provincie Gelderland.

Project 3C: Food Academy Nijkerk

De missie van [Food Academy Nijkerk](#) (FAN) is om meer mensen kennis te laten maken met de foodsector, te vertellen wat er allemaal in deze industrie gebeurt én dit vooral ook te laten zien. Dit doet de organisatie onder andere door jongeren en zij-instromers op te leiden, de foodsector te promoten én regelmatig in gesprek te gaan met samenwerkingspartners vanuit het onderwijs en de overheid.

FAN is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, het onderwijs en de overheid. De eerste fase van de FAN is afgerond: bedrijven en Aeres hebben gezamenlijk een curriculum ontwikkeld en studenten opgeleid. Als bedrijvenvereniging blijft de FAN bestaan en ook de samenwerking met Aeres voor het opleiden van personeel blijft. De FAN is actief in het netwerk en het aantal gezamenlijke activiteiten neemt toe.

Programmamanagement

Het programmamanagement heeft zich in de eerste helft van 2023 gefocust op het verbinden van resultaten uit de Regio Deal aan actuele ontwikkelingen. In nieuwsbrieven, verhalen en bijeenkomsten. Zo is in maart 2023 het omgevingsmeetnetwerk luchtkwaliteit gelanceerd en zijn de eerste inzichten in resultaten besproken met bestuurders. Vanuit het thema Voeding en gezondheid is met wethouders de gezonde voedselomgeving besproken en de mogelijke rol van de overheid hierin. In juni 2023 hebben de [Regio Foodvalley Days](#) plaatsgevonden. Tijdens de brede netwerkbijeenkomst met ruim 100 deelnemers werden projectlocaties bezocht.

Aandachtspunten

Het laatste jaar van de Regio Deal gaat in. Het verbinden van resultaten uit de projecten aan actuele ontwikkelingen en organiseren van impact en vervolg zal komend jaar alle aandacht van alle partners vragen: hoe zorgen we dat de successen van de Regio Deal een vervolg krijgen.

Brede Welvaart Indicator (BWI+)

De Regio Deal is gericht op het bevorderen van de brede welvaart in de regio. Voor de Regio Deal Foodvalley wordt een innovatieve, meer fijnmazige versie van de landelijke Brede Welvaart Indicator ontwikkeld die het mogelijk maakt om ontwikkelingen op gemeenteniveau of zelfs wijkniveau te volgen. Zoals Universiteit Utrecht dit interactief heeft gepresenteerd in het [Rijk-Regio-Overleg](#) maakt dit project onderdeel uit van een landelijke zoektocht naar een monitoringsinstrument waarmee we grip kunnen krijgen op brede welvaart. Het blijkt niet makkelijk om een complexe werkelijkheid eenvoudig uit te drukken in enkele indicatoren. Bovendien zijn niet voor alle indicatoren goede data te vinden. Daarmee is duiding van resultaten en het trekken van conclusies een lastige opgave. Begin 2023 zijn de tussenresultaten van dit Regio Deal project opgeleverd en ambtelijk besproken. Er wordt nog gewerkt aan duiding van de resultaten.

Financiën









De uitputting van de middelen loopt achter op de begroting. Belangrijke aandachtspunten zijn:

Thema 1: het meetnetwerk is later op gang gekomen door verlate levering van meetapparatuur. Voorstel is een budgetneutrale verlenging van dit project waardoor metingen over voldoende seizoenen verkregen kunnen worden.

Thema 2: grote uitgaven worden verwacht in latere fasen van het onderzoek. De vertraging in de uitgaven wordt ingelopen.

Algemene voortgang

Kwalitatieve voortgangsrapportage Regio Deal Foodvalley eerste helft 2023

Onderdeel	Voortgang	Issues
Thema 1: Transitie Landbouw		Om voldoende seizoenen mee te nemen in de resultaten wordt een verlenging van enkele maanden voorgesteld.
Thema 2: Voeding en gezondheid		Omdat enkele projecten uitlopen zal verlenging van enkele maanden worden voorgesteld.
Thema 3A: Fondsen en innovatie		De uitgaven uit de fondsen lopen achter op de planning. Het fonds gedeelde faciliteiten is aangepast waardoor de animo is toegenomen. Bovendien is er een mkb-innovatievoucherregeling aan toegevoegd.
Thema 3B: World Food Experience		Door vernietiging van het bestemmingsplan eind 2022 door de Raad van State kon het definitieve ontwerp niet gerealiseerd worden. Er is een herontwerp gemaakt.
Thema 3C: Food Academy Nijkerk		Fase 1 van de FAN is goed afgerond.
Programmamanagement		
Brede Welvaart Monitor		De tussenmeting is opgeleverd en vraagt om verdere duiding en interpretatie met experts.
Financiën		Vertraging in uitgaven wordt ingelopen.

Thema's en projecten

Overzicht



Thema 1 Transitie landbouw

- Emissiereductie
- Circulair veevoer
- Bodem en Waterkwaliteit
- Implementatie en communicatie




Thema 2 Voeding en gezondheid

- WP1 Prille start
- WP2 Eetomgeving
- WP3 Risicogroepen
- WP4 Kankerpatiënten
- WP5 Kwetsbare ouderen
- WP6 Onderwijs



Thema 3 Kennis en innovatie

- 3A Fondsen en innovatie
- 3B World Food Experience
- 3C Food Academy Nijkerk

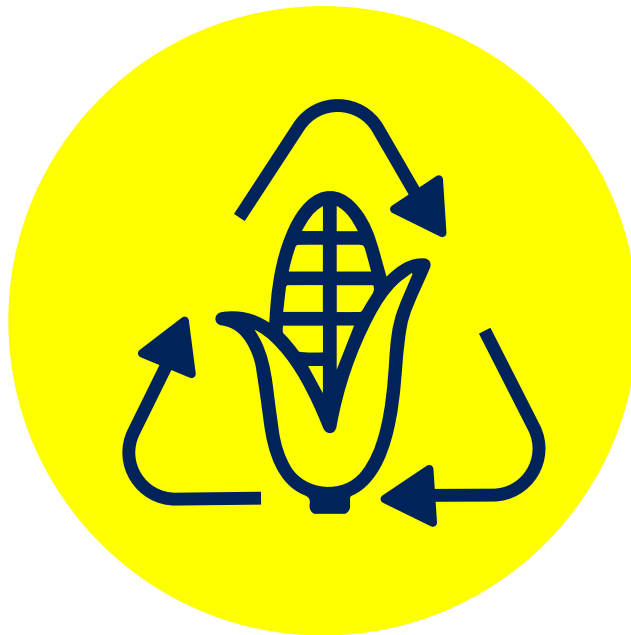

1 Transitie landbouw



Transitie landbouw

I Emissiereductie

1. Emissie reductieopties

2. Sensoring en monitoring emissie en omgeving

3. Proeftuin emissies en gegevensanalyse

II Circulair veevoer

4. Circulair voerscenario's

5. Sensoring diergezondheid en welzijn

6. Proeftuin circulair voerconcept en gegevensanalyse

7. Juridische aspecten/wet en regelgeving

III Bodem en Waterkwaliteit

8. Opties Bodemverbetering en waterkwaliteit

9. Proeftuin bodem en gegevensanalyse

10. Juridische aspecten

IV Implementatie en Communicatie

11. Verdienmodellen

12. Communicatie en effectmonitoring BWI+



Voortgang en beheersmaatregelen

	Toelichting op voortgang
Algemeen <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	In grote lijnen lopen alle werkpakketen volgens planning en binnen budget.
Planning <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Het omgevingsmeetnetwerk stikstof is in maart 2023 gelanceerd en in mei met subsidie van provincie Gelderland uitgebreid met depositiemetingen. Ook worden op 19 agrarische bedrijven emissies in de stal gemeten. Met resultaten van al deze metingen kunnen modellen voor de regio worden geoptimaliseerd en gebruikt worden voor monitoring en scenario-ontwikkelingen. De ervaringen vanuit bodem-en-waterprojecten zijn in september 2023 vastgelegd in een whitepaper en video. De samenwerking die tussen waterschap en agrariërs en onderzoeksinstituten is ontstaan is nuttig, leerzaam en inspirerend en veelbelovend voor (toekomstige) gebiedsgerichte aanpakken.</p> <p>De vogelgriep maakt werven van pluimveebedrijven nog steeds lastig. Daarom wordt er nu breder geworven onder pluimveebedrijven en wordt er meer ruimte geboden aan andere sectoren. Om goede kwaliteit voor een aantal projecten te garanderen is een budgetneutraal verlengingsvoorstel ingediend. We willen bijvoorbeeld de meetnetwerken langer laten draaien om meer data te kunnen verzamelen.</p>
Budget <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Door het verschuiven van budget vanuit het werkpakket Juridische aspecten naar het werkpakket Bodem en Waterkwaliteit en Implementatie en Communicatie is er ruimte gekomen in het verdiepen van succesvolle projecten en voor het ontwikkelen van de kringloopwijzer. Hiermee kunnen de doelen van de Regio Deal beter worden bereikt.</p> <p>De bijdrage van de gemeente Veenendaal is ingezet voor het ontwikkelen van een dashboard voor het bedrijvenmeetnetwerk om agrariërs inzicht te geven in emissies in hun stal. Op dit moment wordt gekeken hoe dit eventueel vervolg kan krijgen om dit breed te kunnen inzetten om benchmarking mogelijk te maken.</p>
Kwaliteit <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Gewenste kwaliteit wordt behaald en koppelingen tussen bestaande projecten en nieuwe ontwikkelen binnen de proeftuin blijven gemaakt worden. Een voorbeeld hiervan dat binnen het project Verdienmodellen een link gemaakt is met professionele foodbedrijven die nu korte keten initiatieven willen ontwikkelen met agrariërs binnen de Regio.
Prestaties <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Geselecteerde innovaties in de proeftuin zijn getest: 5 emissie reducerende maatregelen projecten; 8 projecten met circulair veevoer; 5 bodemverbeteringsprojecten.</p> <p>Omgevingsmeetnetwerk in werking; er zijn 73 punten ingericht, waarvan 53 live te volgen zijn via de website Samen Meten van het RIVM, er wordt gekeken hoe wij dit naar de website metenluchtkwaliteitfoodvalley.nl kunnen doorlinken. Binnen het bedrijvenmeetnetwerk wordt nu op 8 vleesvarkens-, 8 kalver- en 3 pluimveebedrijven gemeten. De eerste versie van het dashboard waarin bedrijven hun data kunnen bekijken is beschikbaar. Dit is ontworpen door OnePlanet.</p> <p>Communicatie en verdienmodellen: website boeraanhetroer.nl, maandelijkse nieuwsbrieven, masterclasses en bodemcursussen, webinar, demonstratiebijeenkomsten, artikelen in de regionale bladen en vakbladen en leertafelbijeenkomst. In 2023 is voor agrariërs het handboek Kruiden zaaien doe je zo! uitgebracht.</p>



1 Transitie landbouw

Beheersmaatregelen

Planning

Voor een aantal projecten is een budgetneutrale verlenging aangevraagd met als doel om meer data te kunnen verzamelen met de meetnetwerken, om meer data te verzamelen in het project circulair veevoer en om succesvolle bodem-en-waterprojecten te kunnen verlengen. De geitensector wordt iets meer benut i.p.v. de pluimveesector. Daarnaast wordt de range voor de pluimveesector iets vergroot, om meer pluimveebedrijven te kunnen betrekken binnen de activiteiten van thema 1.

Budget

Budget dat overblijft in een project is herverdeeld onder projecten waarmee impact kan worden vergroot.

Kwaliteit


Veelbelovend bedrijvenmeetnetwerk met bijbehorende managementmaatregelen is onderdeel geworden van het project emissiereductie, waarmee de kwaliteit omhooggaat van dit project. De resultaten uit de Regio Deal worden vertaald in KPI's en een kringloopwijzer voor intensieve sectoren. Daarmee worden de resultaten geborgd en beschikbaar gemaakt. Er is een verzoek gedaan voor een budgetneutrale verlenging om meer data te kunnen verzamelen m.b.t. de meetnetwerken, om meer data te verzamelen m.b.t. het circulaire veevoer en om voor bodem en water succesvolle projecten te kunnen verlengen.



2 Voeding en gezondheid



Voeding en gezondheid

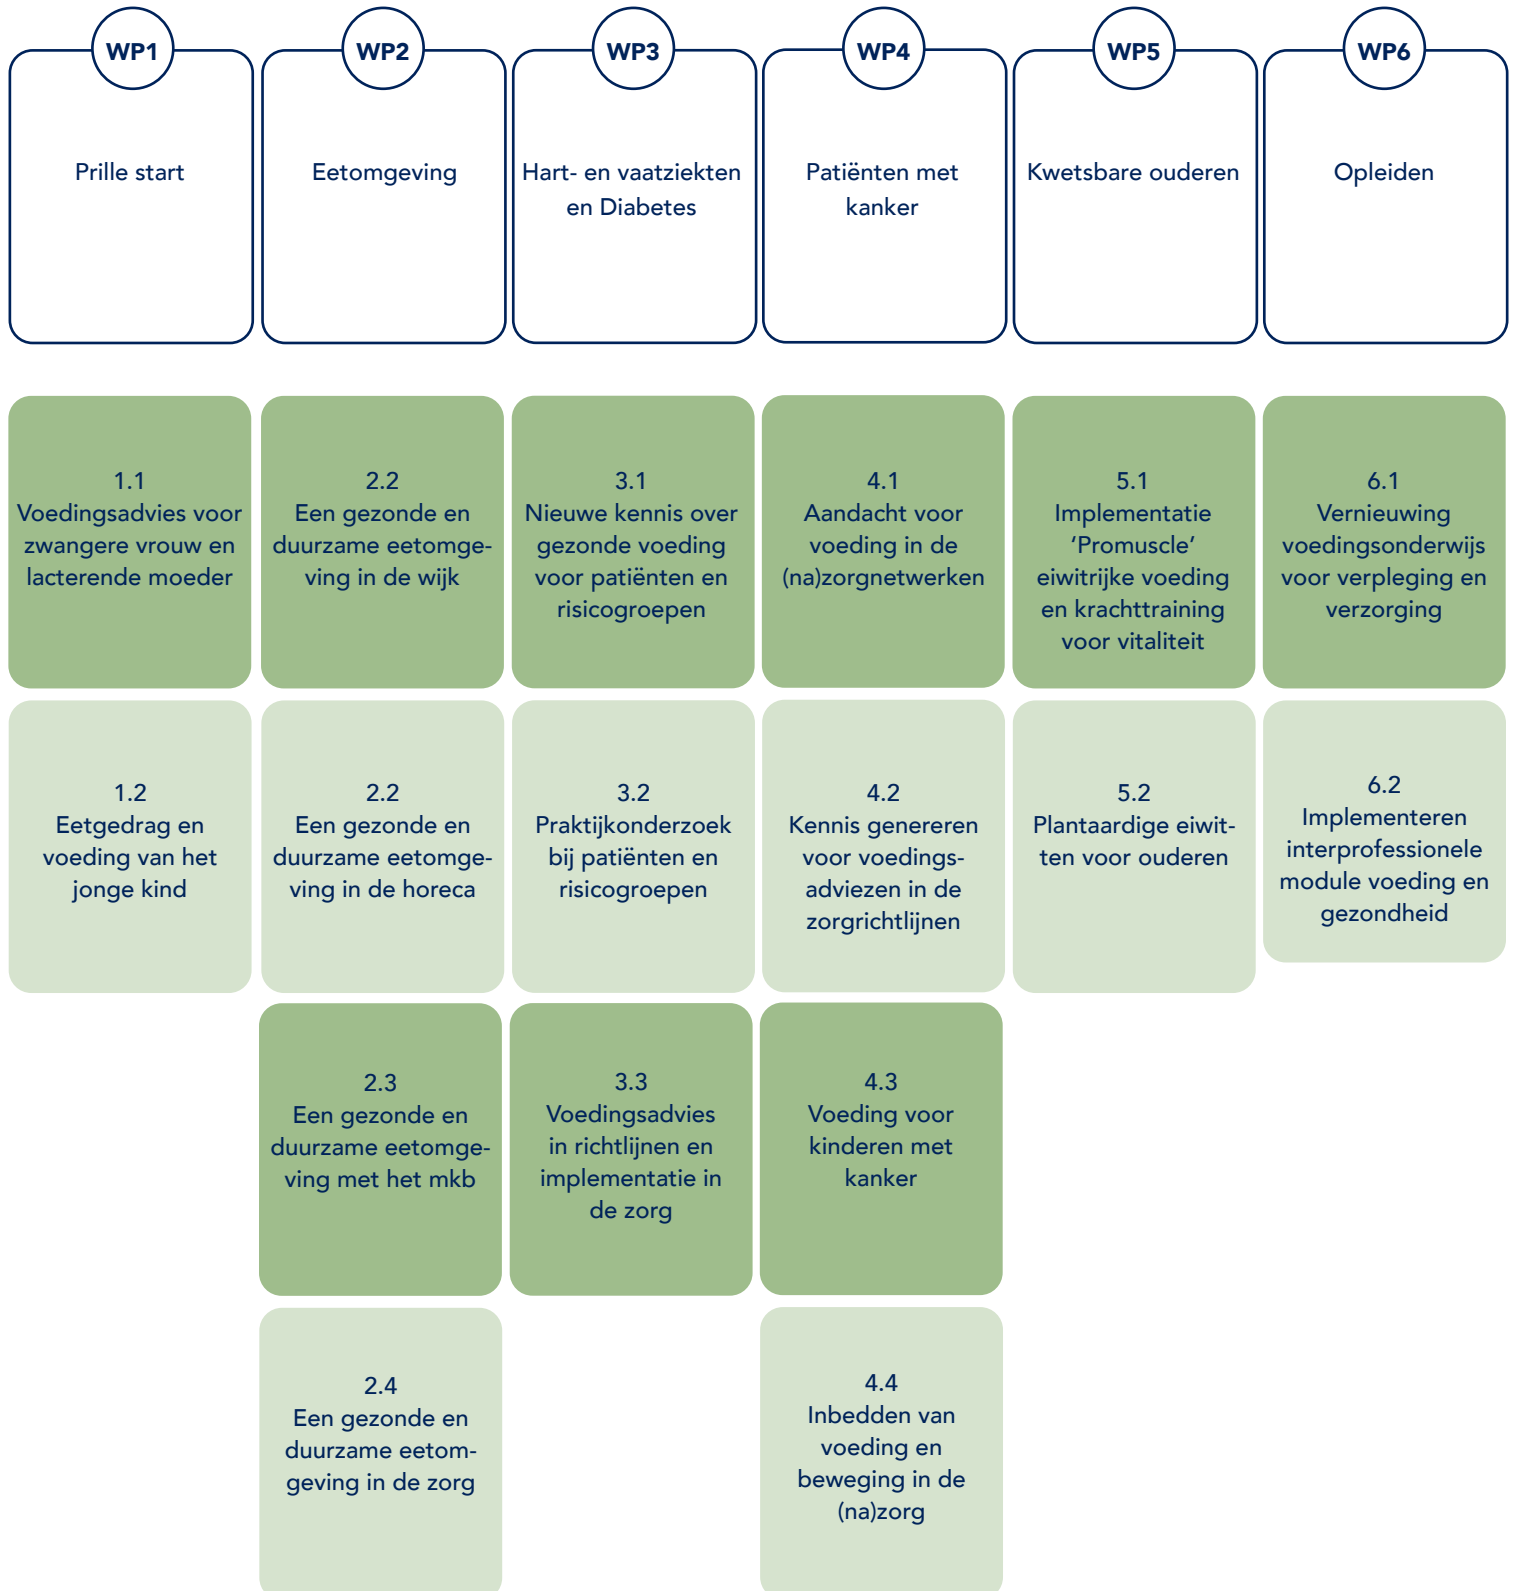



Voortgang en beheersmaatregelen

	Toelichting op voortgang
Algemeen ● ○ ○	Alle zes de werkpakketten (WP's) werken volop aan zowel de uitvoerende als analyserende activiteiten. Van de projecten worden resultaten opgeschreven en gedeeld op events voor professionals. Er zijn verschillende implementatiepilots die ook worden geëvalueerd zoals bijvoorbeeld de interventie Promuscle in de praktijk en de kennis die bij oncologie wordt ingezet in de zorg en daar geëvalueerd wordt. In alle WP's is afstemming en samenwerking met regionale en landelijke partijen/organisaties en wordt nagedacht over implementatie.
Planning ○ ● ○	Bijna alle WP's werken volgens planning. Enkele projecten lopen uit o.a. door zwangerschappen van onderzoekers.
Budget ● ○ ○	Alle WP's hebben de afgesproken besparingen doorgevoerd. Op basis hiervan zijn nieuwe begrotingen ingediend bij de Kassier. De uitputting van thema 2 staat op 56%.
Kwaliteit ● ○ ○	Dit voorjaar is de jaarlijkse sessie met de stakeholders georganiseerd. Hier zijn inhoudelijke ontwikkelingen en bevindingen besproken met een breed palet aan experts van regionale en nationale organisaties. De reacties waren positief, ze zien de relevantie op onderwerpen van gezonde en duurzame voeding en geven aan dat er behoefte is aan goede kennis over voeding in de opleidingen.
Prestaties ● ○ ○	In Q1 en Q2 zijn o.a. wetenschappelijke publicaties en systeemkaarten verschenen en deze zijn toegelicht op congressen en workshops. En er worden gastcolleges en onderwijsprojecten verzorgd voor zorgprofessionals in opleiding, van verpleegkundigen tot artsen. Er zijn sessies verzorgd op het Rijk-Regio-overleg en op de Regio Foodvalley Days. Er wordt actief gecommuniceerd naar diverse doelgroepen, via LinkedIn en via de nieuwsbrief van Regio Deal Foodvalley .

Beheersmaatregelen

Planning

Er is voldoende inloop op de opgelopen vertragingen binnen WP2. Door onder andere zwangerschappen loopt een deel van de projecten uit waarvoor verlenging aangevraagd zal worden.

Budget

De afgesproken besparingen zijn doorgevoerd in de nieuwe begroting en beschikking.

Kwaliteit

Het MT houdt afstemming met de WP's, tijdens meetings met WP-leiders worden ontwikkelingen gedeeld om uitwisseling te bevorderen. Ook werken we aan plannen voor 2024 om kennis te delen met zorgopleidingen en via voorlichting naar doelgroepen.



3 Kennis en innovatie



Voortgang en beheersmaatregelen

	Toelichting op voortgang
Algemeen <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Het digitale platform Foodleap is gelanceerd als matchmaking-platform tussen actoren en hun faciliteiten. Het Innovatie-ecosysteem is versterkt met diverse activiteiten vanuit Foodvalley NL. De fondsen worden actief onder de aandacht gebracht van netwerken in Gelderland en Utrecht. Het fonds voor gedeelde onderzoeksapparatuur is actief gepromoot via Campus Connect. Campus Connect stimuleert contact, verbinding en kennisoverdracht tussen professionals op Wageningen Campus. Op donderdag 6 april 2023 stond Campus Connect in het teken van het delen van onderzoeksapparatuur en innovatiefaciliteiten in de regio. Ook zijn er artikelen gepubliceerd in nieuwsbrieven voor de topsector Agri & Food en zijn er diverse presentaties gegeven over het fonds voor gedeelde apparatuur aan potentiële nieuwe partijen. Aan het fonds gedeelde faciliteiten is een regeling voor mkb-innovatievoucher toegevoegd met een totaalwaarde van € 950.000.</p>
Planning <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>De looptijd van het fonds voor gedeelde faciliteiten is verlengd tot augustus 2029, waardoor ook de belangstelling van bedrijven is toegenomen. Aanvragen dienen wel vóór Q2 2024 ingediend te zijn.</p> <p>De mkb-innovatievoucher is in Q2 gelanceerd voor mkb-bedrijven om gebruik te maken van gedeelde faciliteiten voor het opschalen van technologieën en producten.</p> <p>In de eerste helft van 2023 zijn er geen nieuwe investeringen in gedeelde apparatuur gedaan, waardoor de uitputting van dat fonds enigszins achterloopt. Er staan echter verschillende investeringen in de planning, die waarschijnlijk in de komende maanden zullen worden gerealiseerd.</p>
Budget <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Het fonds voor gedeelde faciliteiten is mogelijk overtekend. Dit kan een uitdaging vormen, zeker als alle initiatieven voldoen aan de vastgestelde beoordelingscriteria en potentie hebben voor financiering, maar het beschikbare budget niet de volledige vraag kan accommoderen. Het beschikbare subsidiebedrag is ongeveer € 5 miljoen. Twee voorstellen voor de mkb-innovatievoucher van € 50.000 elk zijn goedgekeurd, waarmee er nog een saldo van € 850.000 resteert voor voucheraanvragen.</p> <p>De totale investering uit het fonds gedeelde apparatuur loopt enigszins achter: Er zijn geen nieuwe investeringen gedaan in de eerste helft van 2023. De totale investering die in de komende maanden voorzien wordt, is € 1 à 1,5 miljoen.</p>
Kwaliteit <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>De kwaliteit van de ingediende projecten voor de fondsen is goed. Gebruikers geven positieve feedback over zowel de investeringsmogelijkheden, de ondersteuning bij het openstellen van apparatuur en de uitwisseling van expertise die plaatsvindt op de hubs rond gedeelde apparatuur. Bovendien wordt de werkwijze van Shared Research Facilities zoals die in de Regio Foodvalley is ontwikkeld, door andere campussen en science parks gezien als een voorbeeld van best practice.</p>
Prestaties <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Oranje status veroorzaakt door één fonds: Initiatieven voor het fonds gedeelde faciliteiten moeten volledige voorstellen indienen vóór het tweede kwartaal van 2024.</p> <p>De prestaties voor de mkb-innovatievoucher zijn in lijn met de doelstelling.</p> <p>De gedeelde onderzoeksapparatuur wordt goed gebruikt door veel verschillende partijen.</p>



3A Fondsen en innovatie

Beheersmaatregelen

Planning

In het voorjaar is de looptijd van het fonds voor gedeelde faciliteiten verlengd tot augustus 2029. Aanvragen uit het fonds dienen wel vóór Q2 2024 ingediend te zijn.

Het fonds gedeelde apparatuur voorziet de komende maanden investeringen van € 1 à 1,5 miljoen. Begin 2024 zal de stand opgemaakt worden en bepaald worden of er extra acties nodig zijn.

Budget

De dreiging van overschrijving op het fonds voor gedeelde faciliteiten wordt tegengegaan door een beoordelingscriterium: Voor de beoordeling van initiatieven wordt door Foodvalley NL een voorstel opgesteld. De investeringen uit het fonds gedeelde apparatuur lopen dit jaar iets achter. Begin 2024 zal de stand worden opgemaakt en bepaald worden of er extra acties nodig zijn.

Kwaliteit

Deskundigengroepen beoordelen de ingediende projecten om de kwaliteit ervan te garanderen. Wij zien extra risico's bij het investeren in gedeelde proeffabrieken als de eigenaar van de faciliteit niet financieel stabiel is, in navolging van de ontwikkeling van Smaakpark. Wij zien de formele rol van de provincie om de financiële status van een aanvrager te controleren, maar wij zullen het financiële risico meenemen in ons advies aan de provincie bij de beoordeling van toekomstige voorstellen aan het fonds voor gedeelde proeffaciliteiten.



Voortgang en beheersmaatregelen

	Toelichting op voortgang
Algemeen <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	De World Food Experience (WFE) kent, vanwege een aantal oorzaken, vertraging in de uitvoering. Namelijk door: een beroep ingesteld bij de Raad van State begin 2022 door de Samenwerkende Milieuorganisaties Ede (SME) tegen het bestemmingsplan van de WFE, en noodzakelijke aanpassingen in de ontwerpen als gevolg van stijgende bouwkosten. Er is een herontwerp uitgewerkt dat in het najaar van 2023 voorligt bij gemeente Ede en provincie Gelderland.
Planning <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Op dit moment ligt het plan stil omdat besluitvorming in de Raad van gemeente Ede en Staten van provincie Gelderland over het vervolg nog moet plaatsvinden.
Budget <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Het herontwerp past binnen de begroting.
Kwaliteit <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Het herontwerp past binnen de doelen en kwaliteitseisen.
Prestaties <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	De eerste helft van 2023 heeft in het teken gestaan van opstellen herontwerp en voorbereiding van besluitvorming.

Beheersmaatregelen

Planning

Planning is afhankelijk van besluitvormingsmoment. Mede vanwege de Provinciale Statenverkiezingen heeft definitieve besluitvorming nog niet plaats kunnen vinden. In de voorbereiding is er maximaal ingezet op goede voorbereiding van dit moment.

Budget

In de opdracht voor het herontwerp is de randvoorwaarde meegegeven dat dit ontwerp past binnen het budget. Vanwege uitblijven van nieuwbouw is dit mogelijk gebleken, ondanks prijsstijgingen.

Kwaliteit

In het herontwerp is expliciete samenwerking met onderwijsinstellingen gezocht waardoor de aansluiting bij die doelgroep goed is. Ook de aansluiting bij regionale initiatieven en activiteiten is expliciet in het herontwerp ingebracht. Dat komt de kwaliteit van de WFE ten goede.



Voortgang en beheersmaatregelen

	Toelichting op voortgang
Algemeen <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>De eerste fase van de Food Academy Nijkerk (FAN) die bekostigd is uit de Regio Deal Foodvalley is in augustus 2023 afgerond. Daarmee is de projectperiode van de subsidie afgelopen. Alle activiteiten zijn uitgevoerd.</p> <p>Als bedrijvenvereniging blijft de FAN bestaan en ook de samenwerking met Aeres voor het opleiden van personeel blijft.</p> <p>De FAN is actief in het netwerk van bedrijven, scholen en samenwerkingspartners en het aantal gezamenlijke activiteiten neemt toe.</p> <p>Er is binnen de bedrijven meer ruimte en aandacht voor andere thema's zoals duurzame inzetbaarheid, leven lang ontwikkelen en de moeilijke arbeidsmarkt.</p> <p>FAN krijgt steeds meer naamsbekendheid in de regio, de provincie en het land.</p> <p>Binnen de regio hebben we veel contacten met andere human capital-initiatieven en zijn betrokken bij andere initiatiefnemers, zoals Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en Veluwe Portaal.</p> <p>Het blijft een uitdaging om jongeren te werven. De focus bij FAN ligt op de bbl-opleiding omdat dit het beste aansluit bij het type studenten, aard van werkzaamheden en behoefte bij bedrijven. De werkgroep Locatie is druk bezig met de ontwikkeling en concrete invulling van een nieuwe locatie.</p>
Planning <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Alle activiteiten die op de planning stonden, zijn uitgevoerd.</p> <p>De projectperiode van de subsidie is afgelopen. Momenteel wordt gewerkt aan de eindrapportage.</p>
Budget <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>De projectperiode van de subsidie is afgelopen. Momenteel wordt gewerkt aan de eindrapportage.</p>
Kwaliteit <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>We hebben goed contact kunnen leggen met een aantal scholen in Barneveld en Nijkerk. Zij weten ons goed te vinden en we zullen met hen verschillende activiteiten blijven opzetten.</p> <p>Er is meer aandacht voor leren en ontwikkelen binnen organisaties. Dit zien we terug in de aanmeldingen voor onze opleidingen en activiteiten die uitgevoerd worden.</p> <p>Onze leden komen bij elkaar voor verschillende thema's en willen met elkaar werken aan bijvoorbeeld Robotisering.</p>
Prestaties <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Verdriedubbeling in het aantal studenten dat een opleiding of cursus volgt aan de FAN van 2021 naar 2022.</p> <p>Een nieuwe klas gestart in januari 2023 met acht studenten.</p> <p>Nieuwe opleiding ontwikkeld en er is een groep gestart in augustus 2023.</p> <p>Modulair onderwijs aan het ontwikkelen en start in januari 2024.</p> <p>Er zijn twee nieuwe bedrijven lid geworden van de FAN.</p> <p>Meer betrokkenheid van verschillende lagen van een bedrijf dat lid is tijdens bijeenkomsten voor directieleden, HR-professionals en praktijkbegeleiders.</p> <p>Het netwerk binnen het onderwijs is vergroot.</p> <p>Deelgenomen aan twee wervingsactiviteiten voor jongeren.</p> <p>Organiseren van twee wervingsactiviteiten voor jongeren en zij-instromers.</p>



Beheersmaatregelen

Planning

Dankzij de opgedane ervaring gaan wij ons deze tijd inzetten voor activiteiten gericht op naamsbekendheid en werving, dit heeft positief effect op instroom van studenten bij de FAN.

Budget

Er is begin 2023 een wijzigingsverzoek goedgekeurd, zodat wij het budget kunnen inzetten op activiteiten met een waardevol effect op FAN.

Kwaliteit

Via verschillende bijeenkomsten houden wij de bedrijven die lid zijn van de FAN actief. Wij betrekken hen in onze activiteiten.
Voor alle activiteiten is gekeken naar wat past en waar behoefte aan is bij bedrijven. Bijvoorbeeld eens in de acht weken een hele week les, in plaats van iedere week een dag, en focus op de bbl-opleiding, in plaats van de bbl- én bol-opleiding.

Opbouw meerjarenbegroting

De Meerjarenbegroting is ten opzichte van eerdere Voortgangsrapportages bijgesteld op basis van de exacte subsidiebeschikkingen, waarvan de laatste in de tweede helft van 2021 zijn beschikbaar. De algemene organisatiekosten betreft geen subsidie en worden jaarlijks bijgesteld op basis van realisatie uit voorgaande periode.

Programma	Begroting totaal	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Algemene organisatiekosten	€ 2.375.000	€ 1.020.729	€ 343.410	€ 454.344	€ 340.758	€ 215.758
1 Landbouw: subsidie	€ 12.856.500	€ 1.800.000	€ 4.229.075	€ 3.370.692	€ 1.216.846	€ 2.239.887
1 Landbouw: <i>in kind</i>	€ 620.000	€ 86.804	€ 219.446	€ 178.050	€ 74.182	€ 61.518
2 Voeding: subsidie	€ 13.813.500	€ 1.104.708	€ 3.314.125	€ 3.314.125	€ 3.314.125	€ 2.334.417
3A Fondsen: subsidie *	€ 14.000.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000
3B WFE: subsidie	€ 28.000.000	€ 2.400.000	€ 4.152.306	€ 18.635.599	€ 2.812.095	€ 0
3C FAN: subsidie	€ 700.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 0	€ 40.000	€ 300.000
BWI+: Subsidie	€ 400.000	€ 0	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
ICT in thema's **	€ 900.000	€ 279.733	€ 199.560	€ 247.797	€ 127.848	€ 45.061
Totaal	€ 73.233.000	€ 6.871.975	€ 16.337.922	€ 29.800.608	€ 11.525.854	€ 8.696.641

* Fondsen: In voorgaande Voortgangsrapportage werd hier de vulling van het fonds vanuit de Regio Deal middelen weergegeven. De fondsen zijn sinds 2021 volledig gevuld met middelen uit de Regio Deal. De weergave hier betreft vervolgens een begrote investering vanuit de fondsen evenredig verdeeld over de jaren.

** ICT in thema's: Dit betreft geen subsidie vanuit de Kassier maar een rechtstreekse bijdrage vanuit de Regio, gemeente Veenendaal.

Realisatie eerste helft 2023

Programma	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil	Toelichting
Algemene organisatiekosten	€ 340.758	€ 59.353	€ 281.405	Realisatie is in 2023 beperkt door verrekening van BTW en het niet doorbelasten van de regiodealmanager. Tegelijk speelt verlenging van de Regio Deal, waardoor algemene organisatiekosten langer door zullen lopen.
1 Landbouw: subsidie	€ 1.216.846	€ 1.570.929	€ -354.083	
1 Landbouw: <i>in kind</i>	€ 74.182	€ 13.247	€ 60.935	
2 Voeding: subsidie	€ 3.314.125	€ 1.741.877	€ 1.572.248	
3A Fondsen: subsidie *	€ 3.500.000	€ 100.000	€ 3.400.000	Realisatie: € 0,1 mln. voor fonds gedeelde proeffaciliteiten.
3B WFE: subsidie	€ 0	€ 601.124	€ -601.124	Subsidie in eerdere jaren gestort, subsidie voor 2023 opgeschort i.v.m. vernietiging bestemmingsplan.
3C: FAN: subsidie	€ 40.000	€ 37.252	€ 2.748	
BWI+: subsidie	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	
ICT in thema's**	€ 127.848	€ 134.000	€ -6.152	
Totaal	€ 8.713.759	€ 4.357.782	€ 4.355.977	

* Voor de fondsen is hier de uitputting tot nu toe beschreven.

** Voor de inzet vanuit Veenendaal is hier de verwachte inzet en daadwerkelijke inzet beschreven.

Cumulatieve realisatie 2019, 2020, 2021, 2022, 1e helft 2023

Programma	Beschikt	Realisatie	Percentage	Toelichting
Algemene organisatiekosten	€ 2.375.000	€ 1.578.359	66%	Algemene organisatiekosten zullen langer doorlopen vanwege uitloop van projecten.
1 Landbouw: subsidie	€ 10.616.613	€ 8.230.915	78%	
1 Landbouw: <i>in kind</i>	€ 558.482	€ 514.537	92%	
2 Voeding: subsidie	€ 11.047.083	€ 7.829.935	71%	
3A Fondsen: subsidie	€ 14.000.000	€ 4.850.000	35%	Benutting van fondsen: € 3,85 mln. fonds gedeelde apparatuur en € 1,0 mln. fonds gedeelde faciliteiten.
3B WFE: subsidie	€ 10.637.784	€ 6.829.668	64%	Subsidie vanwege beroep bestemmingsplan opgeschort. Tegelijk liggen vanwege vernietiging van het bestemmingsplan de bestedingen ten behoeve van de Experience ver onder de eerdere ramingen.
3C: FAN: subsidie	€ 400.000	€ 334.671	84%	
BWI+: subsidie	€ 400.000	€ 400.000	100%	
ICT in thema's	€ 854.939	€ 211.500	25%	Dit betreft geen subsidie maar de begrote inzet vanuit gemeente Veendam. Naast de gerealiseerde bijdragen staat er nog voor € 185.000 verplichtingen open waarvoor vanuit de thema's opdrachten zijn verstrekt, en zijn nog € 142.000 aan ICT-gerelateerde verplichtingen voorzien. Daarmee ontbreekt er nog voor € 361.500 aan inzet die vanuit de Regio wordt verwacht.



Bedankt voor uw aandacht.
